Mission d'AMO pour la construction d'un groupe scolaire et d'un restaurant scolaire à VILLEBAROU (41)

Planning Opérationnel Prévisionnel -V1
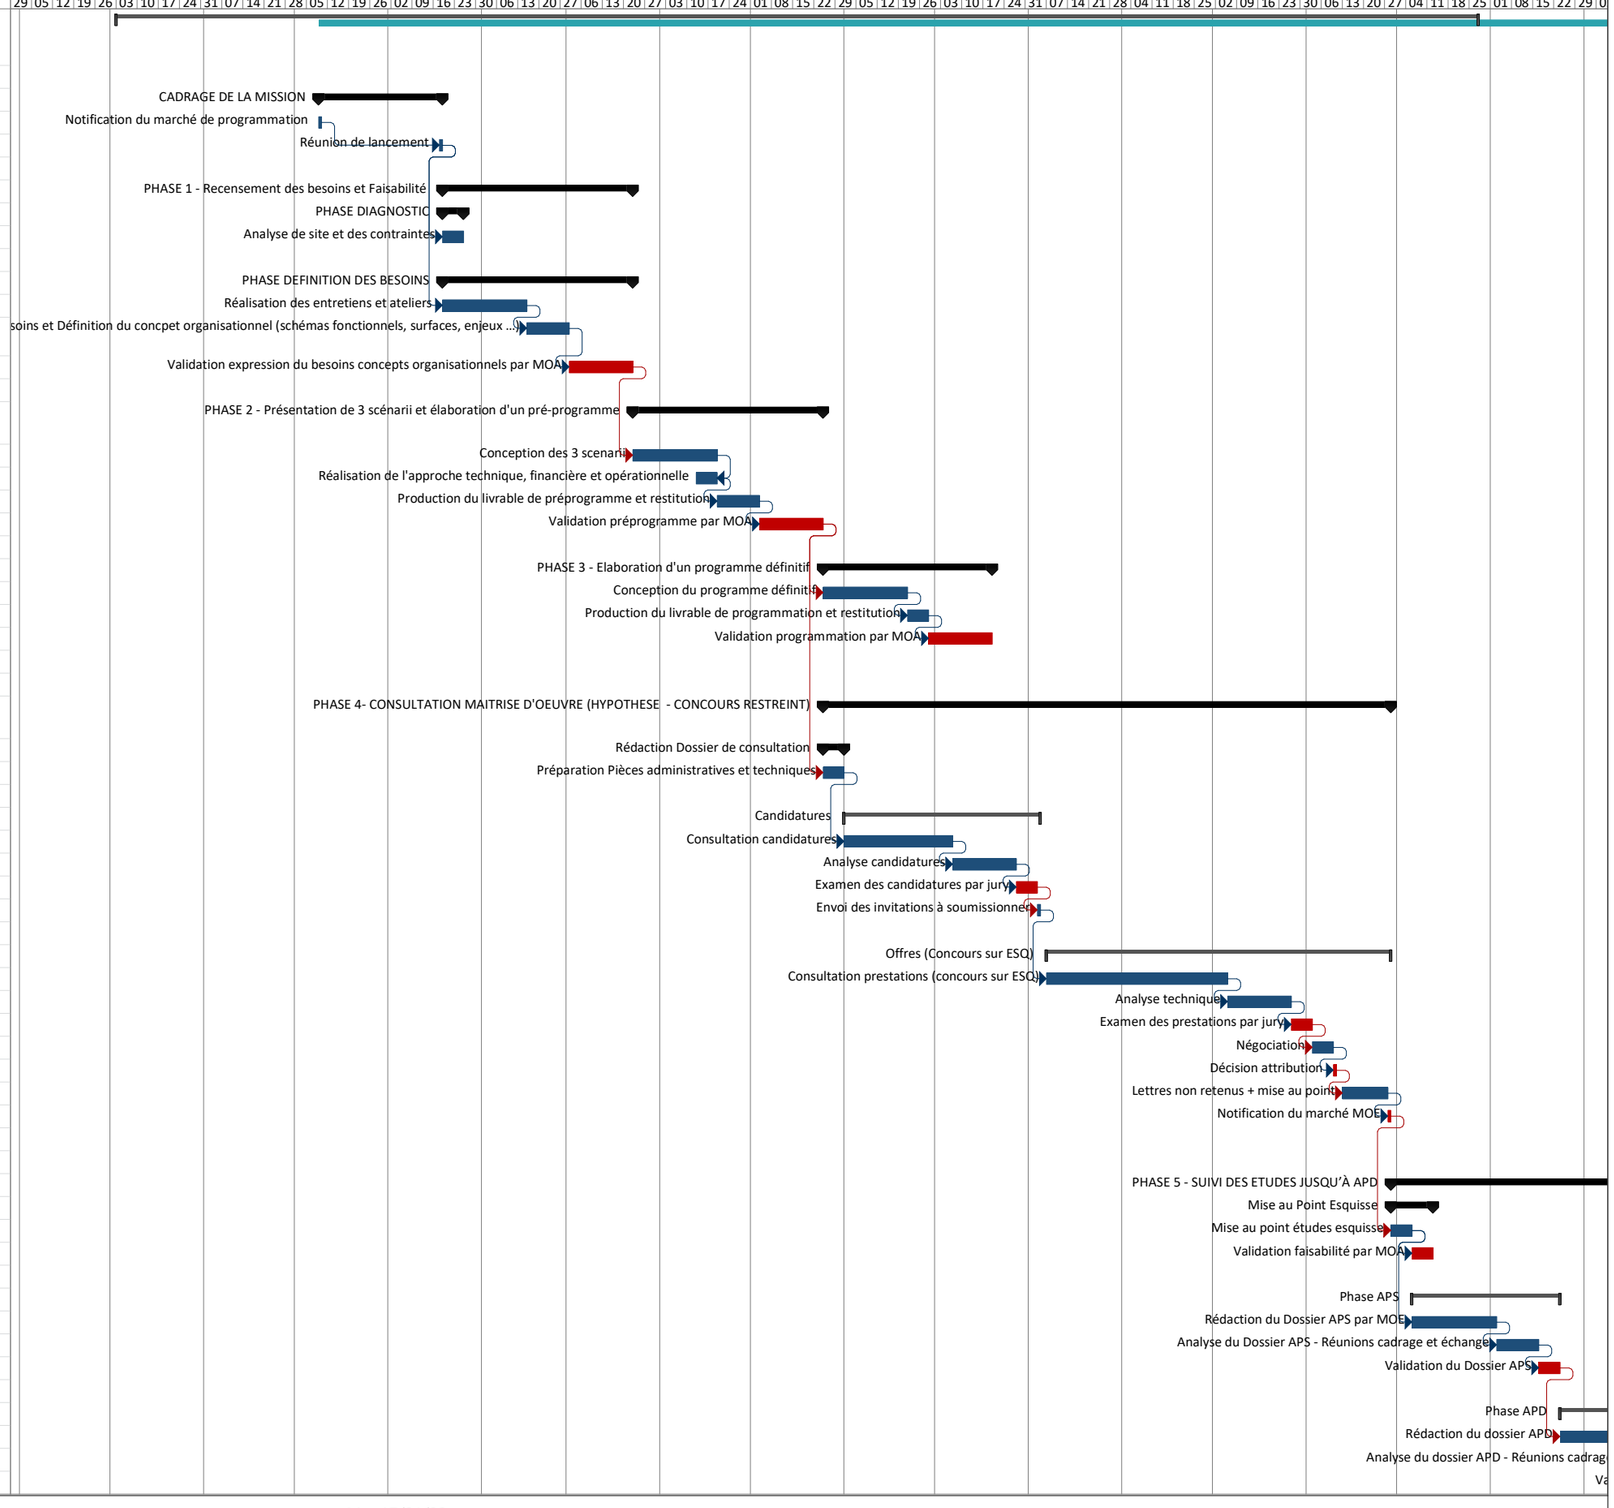
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	**VILLEBAROU - GROUPE SCOLAIRE ET RESTAURANT SCOLAIRE- AMO**	**323 jrs**	**Lun 03/10/22**	**Mer 27/12/23**	
2					
3	**CADRAGE DE LA MISSION**	**29 jrs**	**Ven 09/12/22**	**Mer 18/01/23**	
4	Notification du marché de programmation	1 jr	Ven 09/12/22	Ven 09/12/22	
5	Réunion de lancement	1 jr	Mer 18/01/23	Mer 18/01/23	4
6					
7	**PHASE 1 - Recensement des besoins et Faisabilité**	**45 jrs**	**Jeu 19/01/23**	**Mer 22/03/23**	
8	**PHASE DIAGNOSTIC**	**5 jrs**	**Jeu 19/01/23**	**Mer 25/01/23**	
9	Analyse de site et des contraintes	1 sem.	Jeu 19/01/23	Mer 25/01/23	5
10					
11	**PHASE DEFINITION DES BESOINS**	**45 jrs**	**Jeu 19/01/23**	**Mer 22/03/23**	
12	Réalisation des entretiens et ateliers	4 sem.	Jeu 19/01/23	Mer 15/02/23	5
13	Synthèse des besoins et Définition du concpet organisationnel (schémas fonctionnels, surfaces, enjeux ...)	2 sem.	Jeu 16/02/23	Mer 01/03/23	12
14	Validation expression du besoins concepts organisationnels p	3 sem.	Jeu 02/03/23	Mer 22/03/23	13
15					
16	**PHASE 2 - Présentation de 3 scénarii et élaboration d'un pré-programme**	**45 jrs**	**Jeu 23/03/23**	**Mer 24/05/23**	
17	Conception des 3 scenarii	4 sem.	Jeu 23/03/23	Mer 19/04/23	14
18	Réalisation de l'approche technique, financière et opérationnelle	1 sem.	Jeu 13/04/23	Mer 19/04/23	17FF
19	Production du livrable de préprogramme et restitution	2 sem.	Jeu 20/04/23	Mer 03/05/23	18
20	Validation préprogramme par MOA	3 sem.	Jeu 04/05/23	Mer 24/05/23	19
21					
22	**PHASE 3 - Elaboration d'un programme définitif**	**40 jrs**	**Jeu 25/05/23**	**Mer 19/07/23**	
23	Conception du programme définitif	4 sem.	Jeu 25/05/23	Mer 21/06/23	20
24	Production du livrable de programmation et restitution	1 sem.	Jeu 22/06/23	Mer 28/06/23	23
25	Validation programmation par MOA	3 sem.	Jeu 29/06/23	Mer 19/07/23	24
26					
27					
28	**PHASE 4- CONSULTATION MAITRISE D'OEUVRE (HYPOTHESE - CONCOURS RESTREINT)**	**134 jrs**	**Jeu 25/05/23**	**Mar 28/11/23**	
29	**Rédaction Dossier de consultation**	**5 jrs**	**Jeu 25/05/23**	**Mer 31/05/23**	
30	Préparation Pièces administratives et techniques	5 jrs	Jeu 25/05/23	Mer 31/05/23	20
31					
32	**Candidatures**	**47 jrs**	**Jeu 01/06/23**	**Ven 04/08/23**	
33	Consultation candidatures	26 jrs	Jeu 01/06/23	Jeu 06/07/23	30
34	Analyse candidatures	3 sem.	Ven 07/07/23	Jeu 27/07/23	33
35	Examen des candidatures par jury	5 jrs	Ven 28/07/23	Jeu 03/08/23	34
36	Envoi des invitations à soumissionner	1 jr	Ven 04/08/23	Ven 04/08/23	35
37					
38	**Offres (Concours sur ESQ)**	**82 jrs**	**Lun 07/08/23**	**Mar 28/11/23**	
39	Consultation prestations (concours sur ESQ)	2 m	Lun 07/08/23	Jeu 05/10/23	36
40	Analyse technique	3 sem.	Ven 06/10/23	Jeu 26/10/23	39
41	Examen des prestations par jury	5 jrs	Ven 27/10/23	Jeu 02/11/23	40
42	Négociation	5 jrs	Ven 03/11/23	Jeu 09/11/23	41
43	Décision attribution	1 jr	Ven 10/11/23	Ven 10/11/23	42
44	Lettres non retenus + mise au point	11 jrs	Lun 13/11/23	Lun 27/11/23	43
45	Notification du marché MOE	1 jr	Mar 28/11/23	Mar 28/11/23	44
46					
47					
48	**PHASE 5 - SUIVI DES ETUDES JUSQU'À APD**	**90 jrs**	**Mer 29/11/23**	**Mar 02/04/24**	
49	**Mise au Point Esquisse**	**10 jrs**	**Mer 29/11/23**	**Mar 12/12/23**	
50	Mise au point études esquisse	1 sem.	Mer 29/11/23	Mar 05/12/23	45
51	Validation faisabilité par MOA	1 sem.	Mer 06/12/23	Mar 12/12/23	50
52					
53	**Phase APS**	**35 jrs**	**Mer 06/12/23**	**Mar 23/01/24**	
54	Rédaction du Dossier APS par MOE	4 sem.	Mer 06/12/23	Mar 02/01/24	50
55	Analyse du Dossier APS - Réunions cadrage et échange	2 sem.	Mer 03/01/24	Mar 16/01/24	54
56	Validation du Dossier APS	5 jrs	Mer 17/01/24	Mar 23/01/24	55
57					
58	**Phase APD**	**50 jrs**	**Mer 24/01/24**	**Mar 02/04/24**	
59	Rédaction du dossier APD	6 sem.	Mer 24/01/24	Mar 05/03/24	56
60	Analyse du dossier APD - Réunions cadrage et échange	3 sem.	Mer 06/03/24	Mar 26/03/24	59
61	Validation du dossier APD	5 jrs	Mer 27/03/24	Mar 02/04/24	60
